


Planungs- und Bauterminplan

Stadtentwässerung Dresden - Austausch BHKW B und Neubau BHKW D

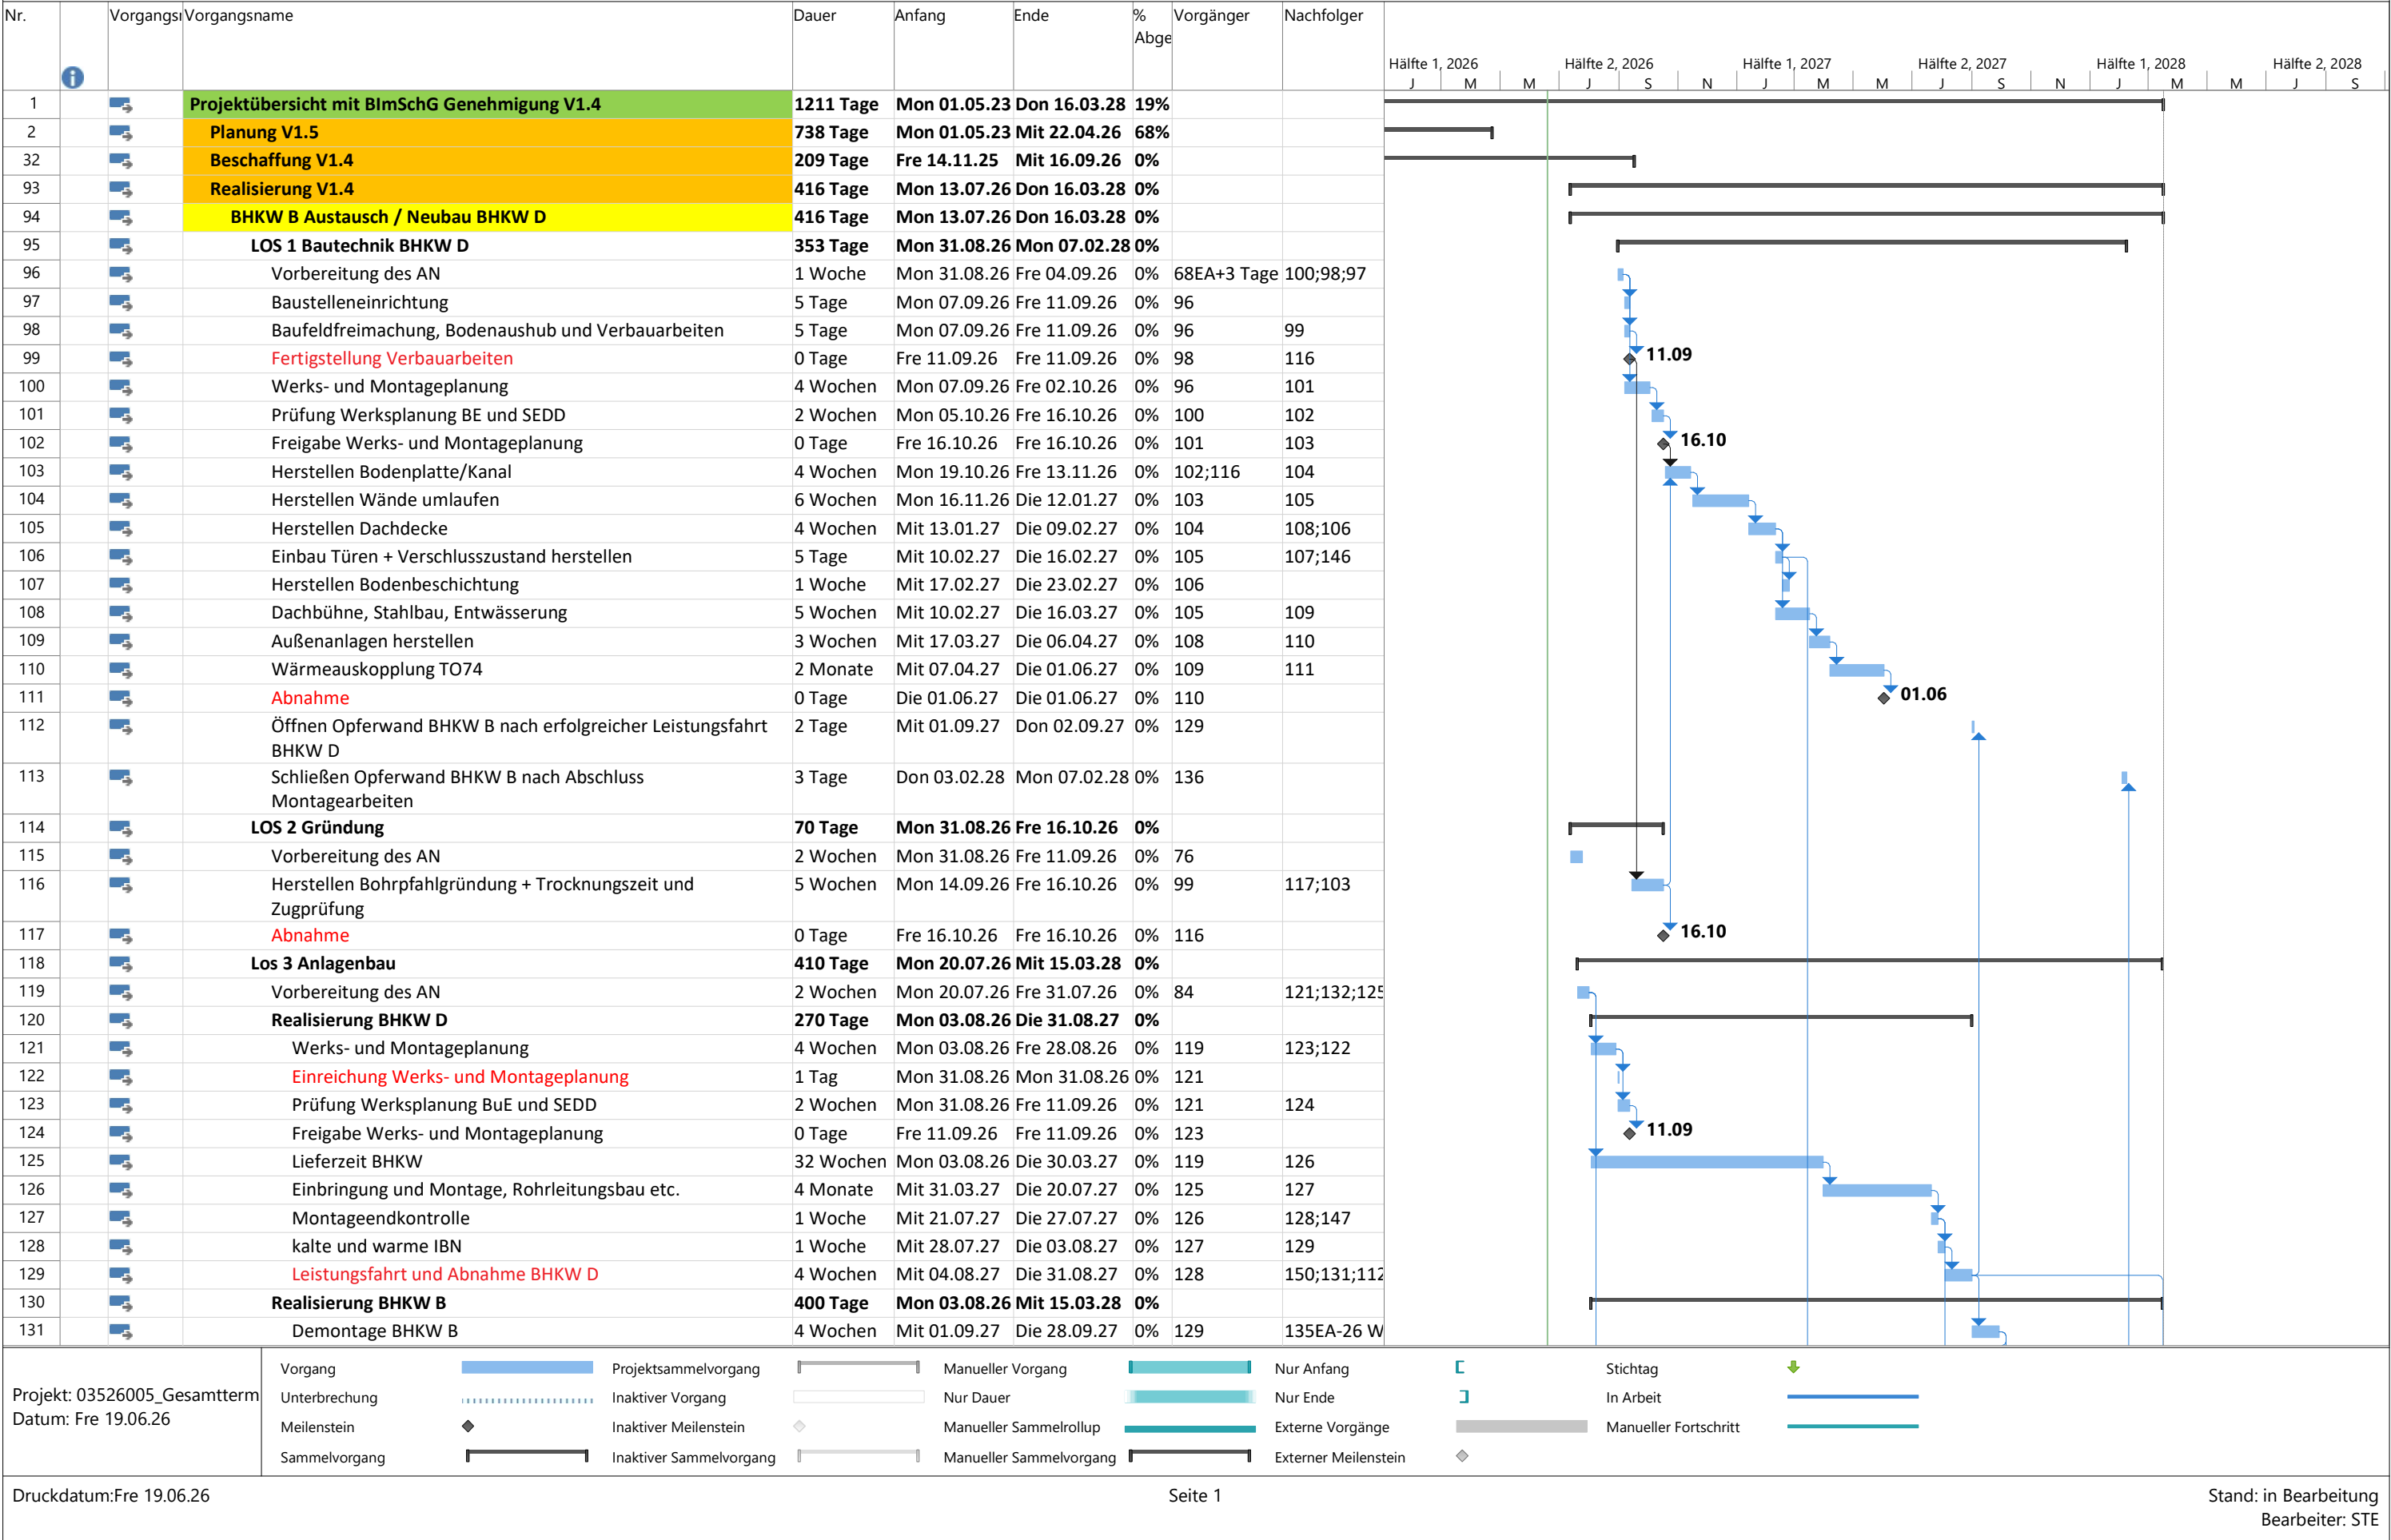

Planungs- und Bauterminplan

Stadtentwässerung Dresden - Austausch BHKW B und Neubau BHKW D

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abge	Vorgänger	Nachfolger																								
										Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028								
132			Werks- und Montageplanung	6 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 11.09.26	0%	119	133	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S							
133			Prüfung Werksplanung BuE und SEDD	4 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26	0%	132	134																								
134			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26	0%	133							09.10																		
135			Lieferzeit BHKW	26 Wochen	Mit 31.03.27	Die 28.09.27	0%	131EA-26 Wc	136																								
136			Einbringung und Montage, Rohrleitungsbau etc.	4 Monate	Mit 29.09.27	Mit 02.02.28	0%	135	137;113																								
137			Montageendkontrolle	1 Woche	Don 03.02.28	Mit 09.02.28	0%	136	138;149																								
138			kalte und warme IBN	1 Woche	Don 10.02.28	Mit 16.02.28	0%	137	139																								
139			Leistungsfahrt und Abnahme BHKW B	4 Wochen	Don 17.02.28	Mit 15.03.28	0%	138	150																								
140			Los 4 EMSR	357 Tage	Don 17.09.26	Mit 01.03.28	0%																										
141			Vorbereitung AN	2 Wochen	Don 17.09.26	Mit 30.09.26	0%	92	142																								
142			Werks- und Montageplanung	6 Wochen	Don 01.10.26	Mit 11.11.26	0%	141	143																								
143			Prüfung Werksplanung BuE und SEDD	2 Wochen	Don 12.11.26	Mit 25.11.26	0%	142	144																								
144			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Mit 25.11.26	Mit 25.11.26	0%	143	145																								
145			Lieferzeit Trafo für BHKW B+D	13 Wochen	Don 26.11.26	Fre 12.03.27	0%	144	146						25.11																		
146			Einbau Trafo BHKW D/Anpassung MS/NS	3 Monate	Mon 15.03.27	Fre 04.06.27	0%	145;106																									
147			IBN Phase BHKW D	15 Tage	Mit 28.07.27	Die 17.08.27	0%	127																									
148			Demontage und Einbau Trafo BHKW B	1 Monat	Mit 29.09.27	Die 26.10.27	0%	131																									
149			IBN Phase BHKW B	15 Tage	Don 10.02.28	Mit 01.03.28	0%	137																									
150			Projektabschluss und Übergabe an AG	1 Tag	Don 16.03.28	Don 16.03.28	0%	129;139																									
